




## wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

Na de zomervakantie, in de loop van september 2022, gaat de schep in de grond. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Op de plattegrond hieronder ziet u wanneer welk deel van het plein wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

Deze planning kan op onderdelen nog wijzigen, voor de meest recente informatie bezoek de website:

[jouwgrotemarkt.groningen.nl](http://jouwgrotemarkt.groningen.nl)

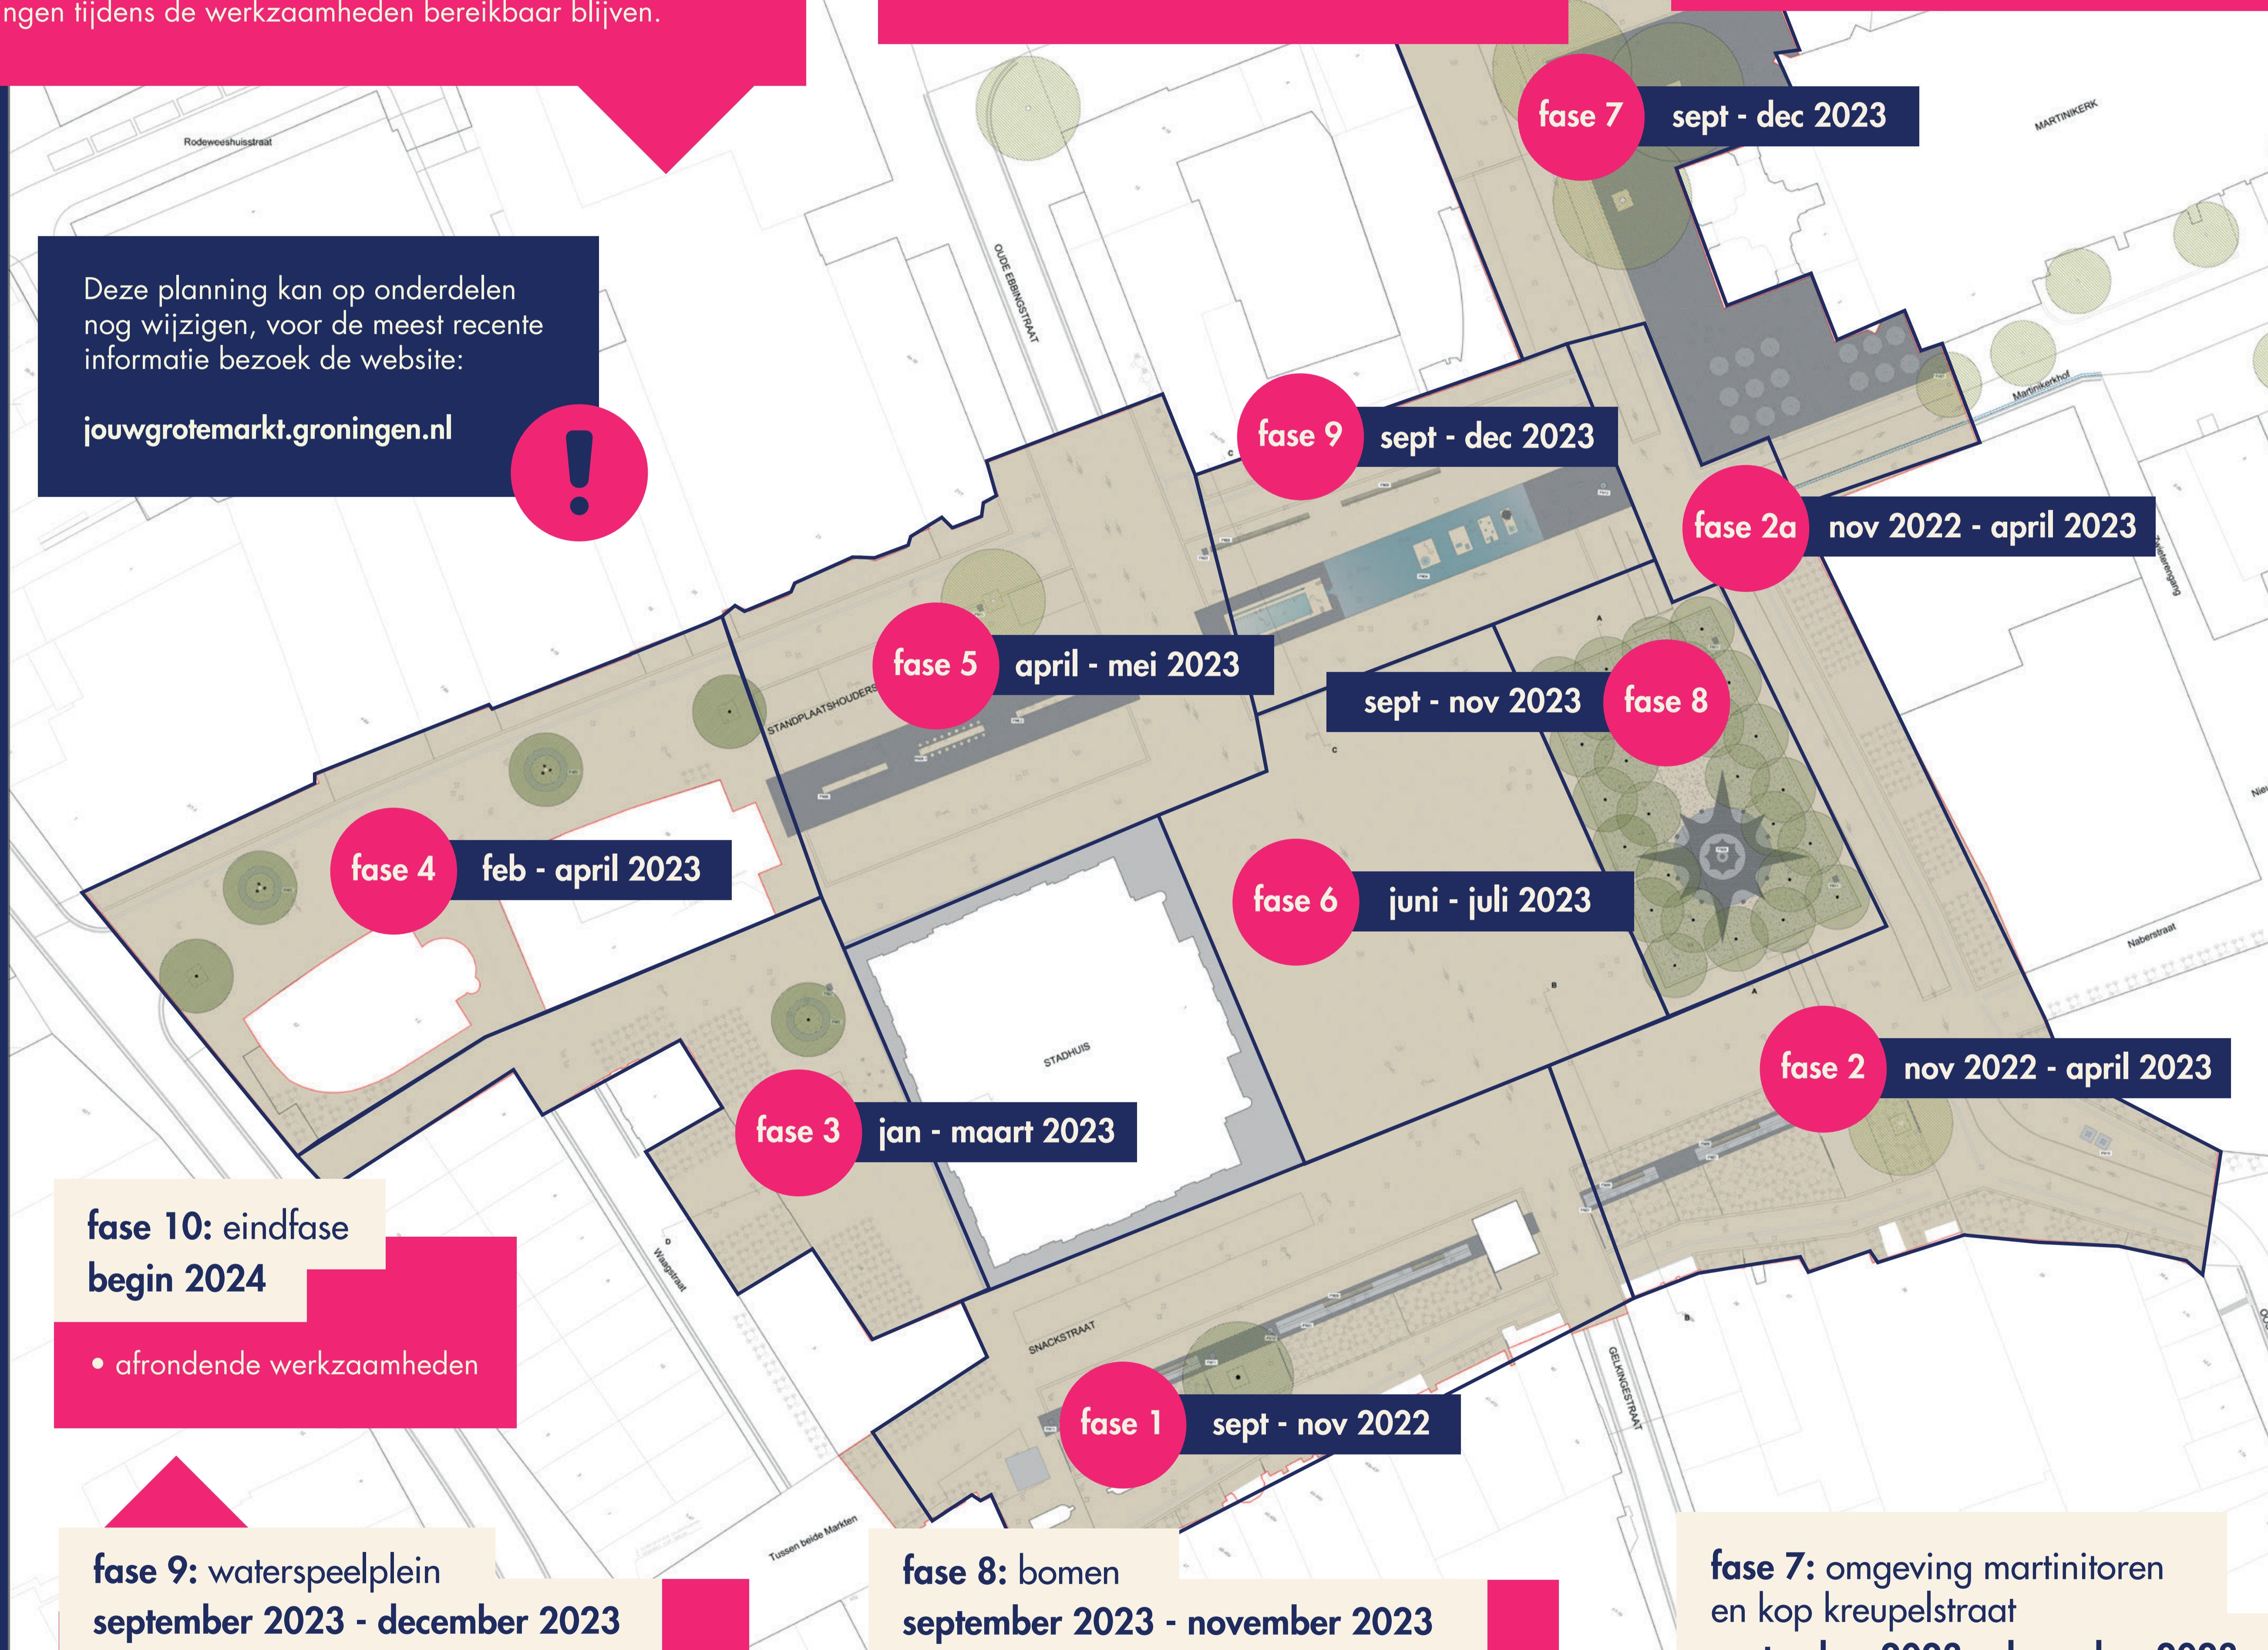

**fase 1:** tussen beide markten en kop gelkingestraat  
september 2022 - november 2022

- aanleg regenwaterleiding
- archeologisch onderzoek
- verplaatsen kabels en leidingen
- aanleg gedeelte kop gelkingestraat
- stremming kop gelkingestraat gedurende circa 4 weken

**fase 2:** kop gelkingestraat en oostwand  
november 2022 - april 2023

- archeologisch onderzoek
- aanleg regenwaterleiding
- na jaarwisseling stremming kop oosterstraat gedurende 8-10 weken

**fase 2a:** kop martinikerkhof  
april 2023 - mei 2023

- ondergrondse werkzaamheden (voor onder andere riolering)

**fase 3:** waagplein  
januari 2023 - maart 2023

- archeologisch onderzoek
- verleggen kabels en leidingen
- voorbereiden waterelement
- plaatsen boom en waterelement gebeurt tijdens latere fase

**fase 4:** noordwand aan de kant van de guldenstraat  
februari 2023 - april 2023

- archeologisch onderzoek
- netwerkbedrijven vervangen oude gas- en waterleidingen langs gevel
- (verbouw)activiteiten in pand naast groot handelshuis

**fase 5:** noordwand deel rondom kop ebbingestraat  
april 2023 - mei 2023

- netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen
- aanleg regenwaterleiding
- standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie

**fase 6:** plein voor het stadhuis  
juni 2023 - juli 2023

- bestrating open middenplein
- plein kan niet worden gebruikt voor evenementen en demonstraties
- aan noordzijde aanleg regenwaterleiding

**fase 10:** eindfase  
begin 2024

- afrondende werkzaamheden

**fase 9:** waterspeelplein  
september 2023 - december 2023

- vrijmaken technische ruimte
- plaatsen ondergrondse waterbuffer
- verplaatsen taxi's naar nieuwe (nog nader te bepalen) standplaats

**fase 8:** bomen  
september 2023 - november 2023

- archeologisch onderzoek (ongeveer 8 weken) op plek bomengroep
- plaatsen bomen uit bomengroep gelijktijdig met andere nieuwe bomen op en rondom grote markt

**fase 7:** omgeving martinitoren en kop kreupelstraat  
september 2023 - december 2023

- aanleg bestrating rondom martinitoren en kop kreupelstraat
